

Processo, progetto e gestione

Organizzazione

- Le **organizzazioni** sono soggetti pubblici o privati costituiti da gruppi di persone che svolgono attività di diversa natura, finalizzate a degli **obiettivi specifici**.



➤ Quali fra queste possono essere considerate organizzazioni?

- ☐ Ospedale
- ☐ Famiglia
- ☐ Banca
- ☐ Scuola
- ☐ Inps
- ☐ Samsung

Le organizzazioni sono soggetti pubblici o privati costituiti da gruppi di persone che svolgono attività di diversa natura, finalizzate a degli obiettivi specifici.



► Quali fra queste possono essere considerate organizzazioni?

- ✓ Ospedale
- ✓ Famiglia
- ✓ Banca
- ✓ Scuola
- ✓ Inps
- ✓ Samsung

Le organizzazioni sono soggetti pubblici o privati costituiti da gruppi di persone che svolgono attività di diversa natura, finalizzate a degli obiettivi specifici.

Organizzazione

- Un'organizzazione, per raggiungere gli **obiettivi** specifici, effettua delle azioni, organizzate in **processi**.




In inglese "obiettivo"
si dice ***target***
(letteralmente
"bersaglio")

Processo


- I **processi** sono le attività svolte con continuità all'interno delle organizzazioni, sono costituiti da una sequenza di operazioni note eseguite per realizzare gli obiettivi dell'organizzazione.




Esempio: processo di vendita

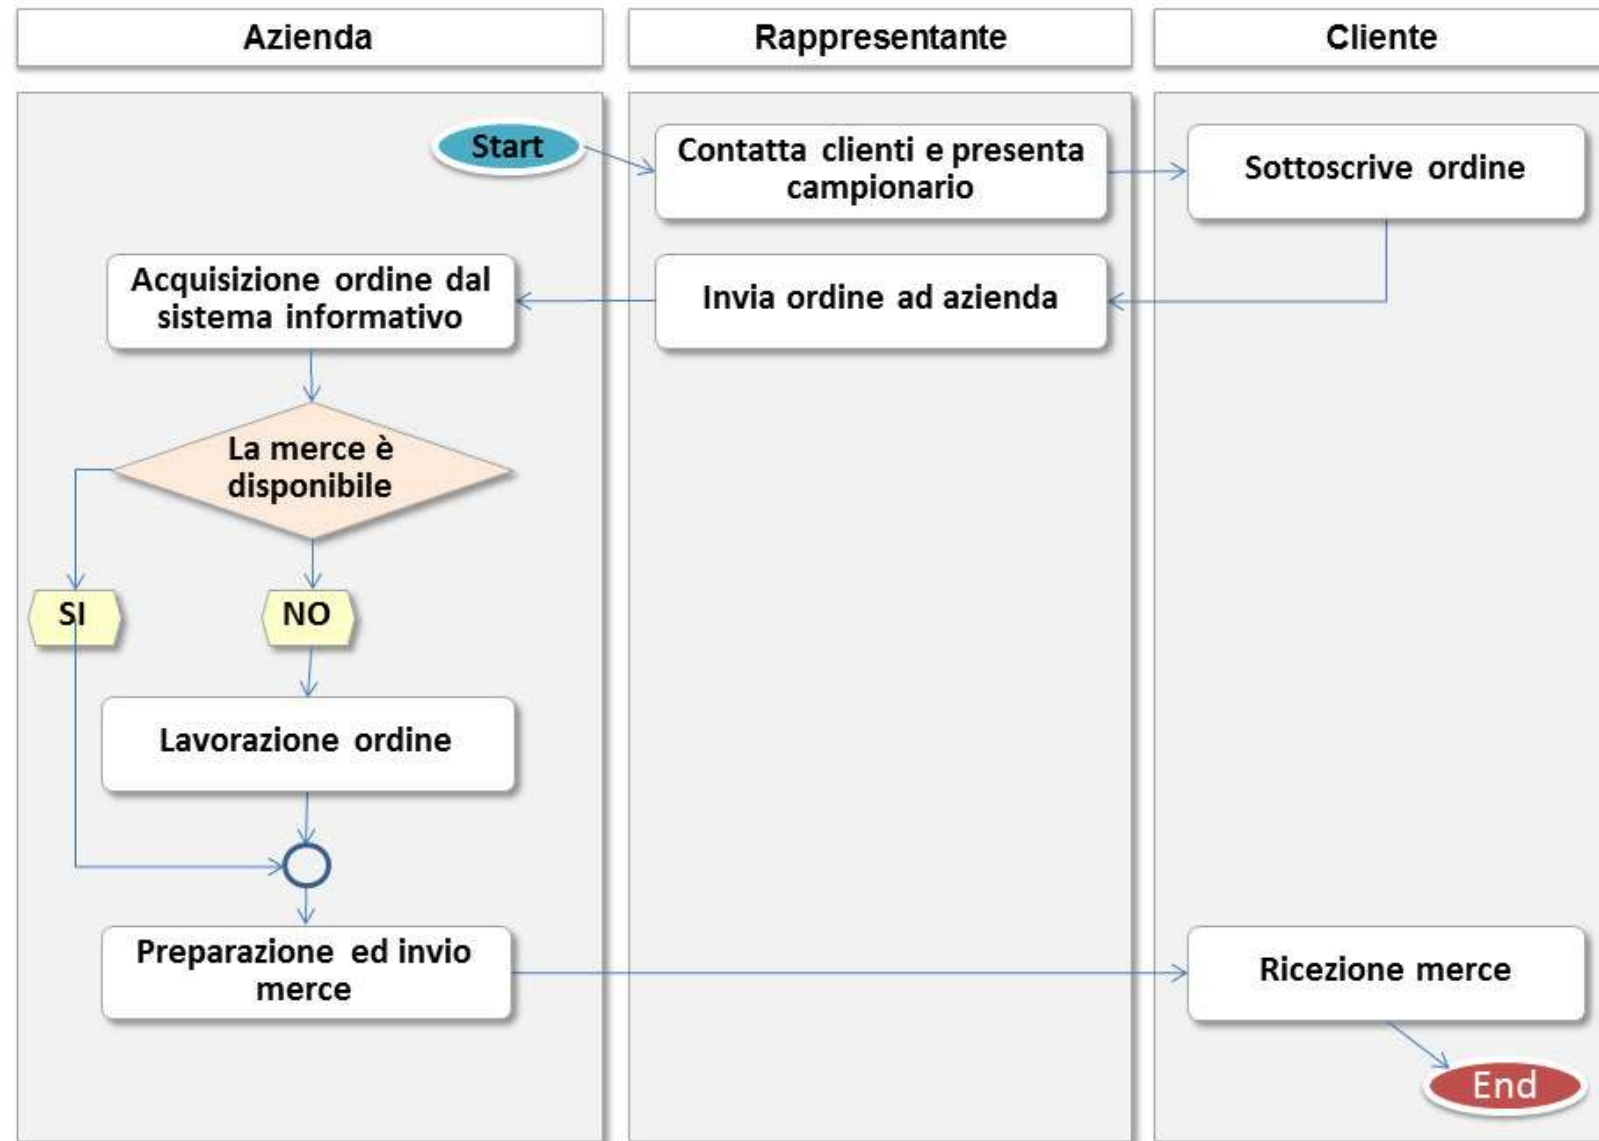

Esempio: processo di vendita


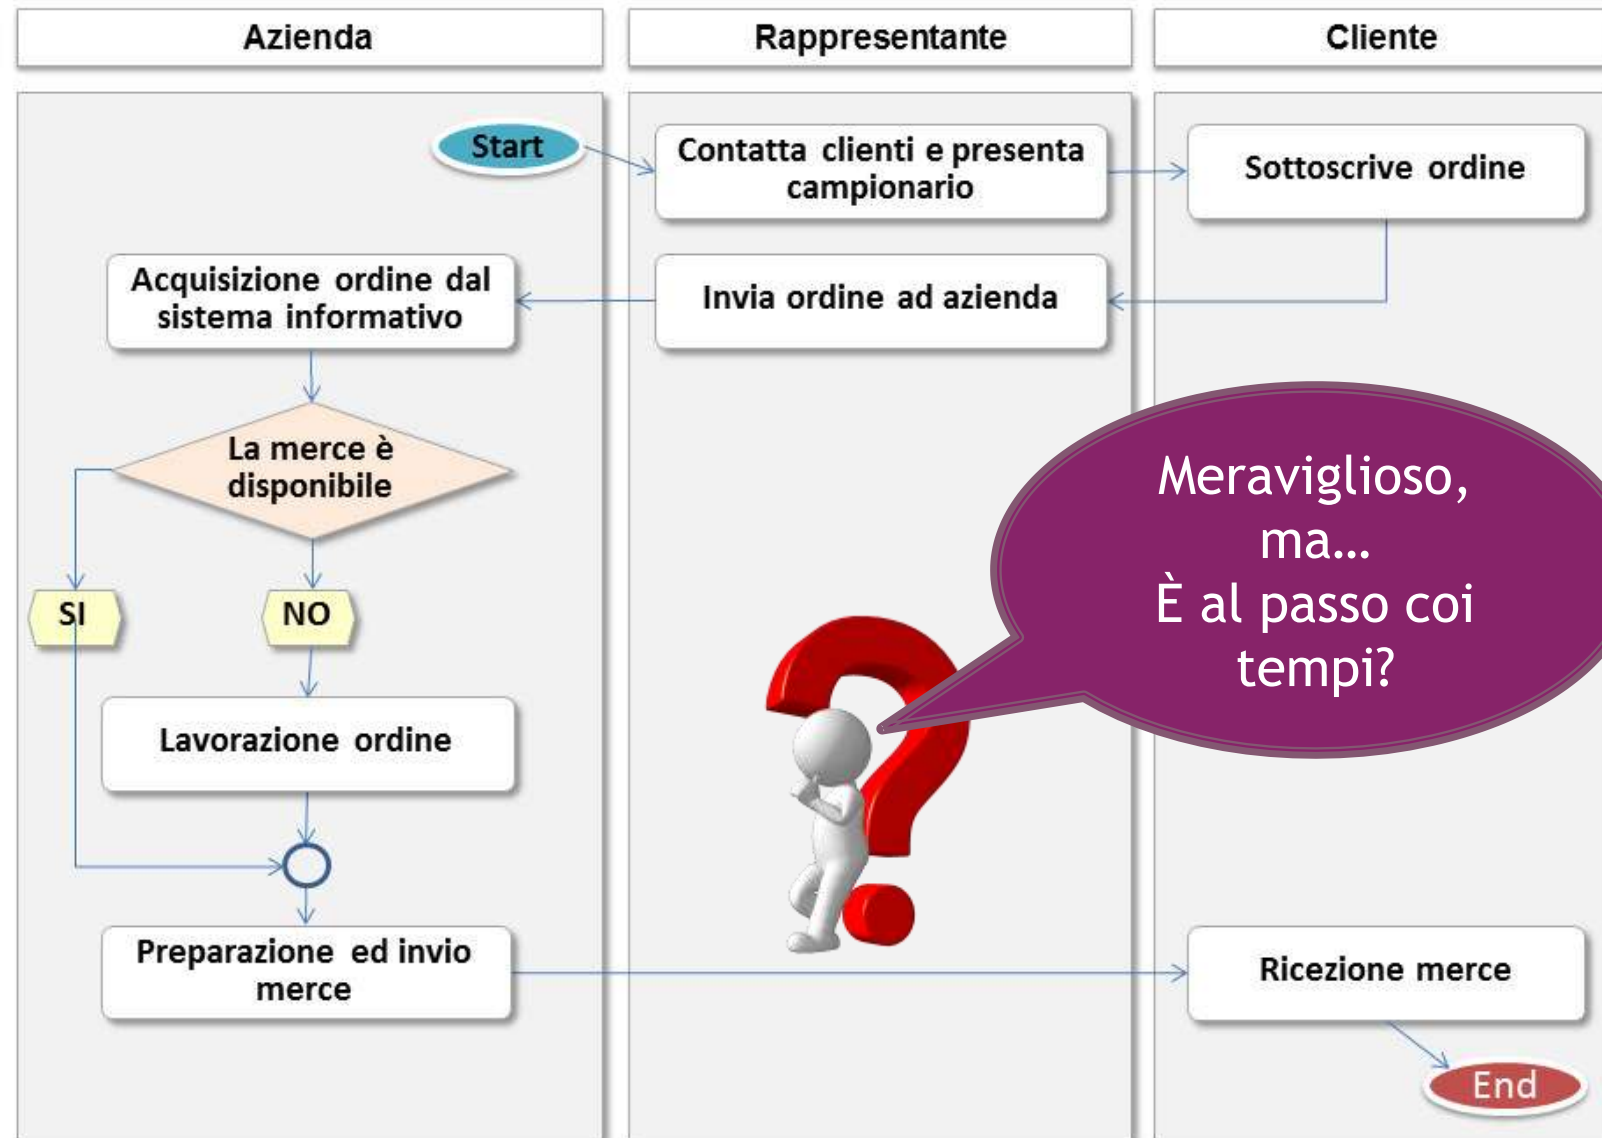


Esempio: processo di vendita online

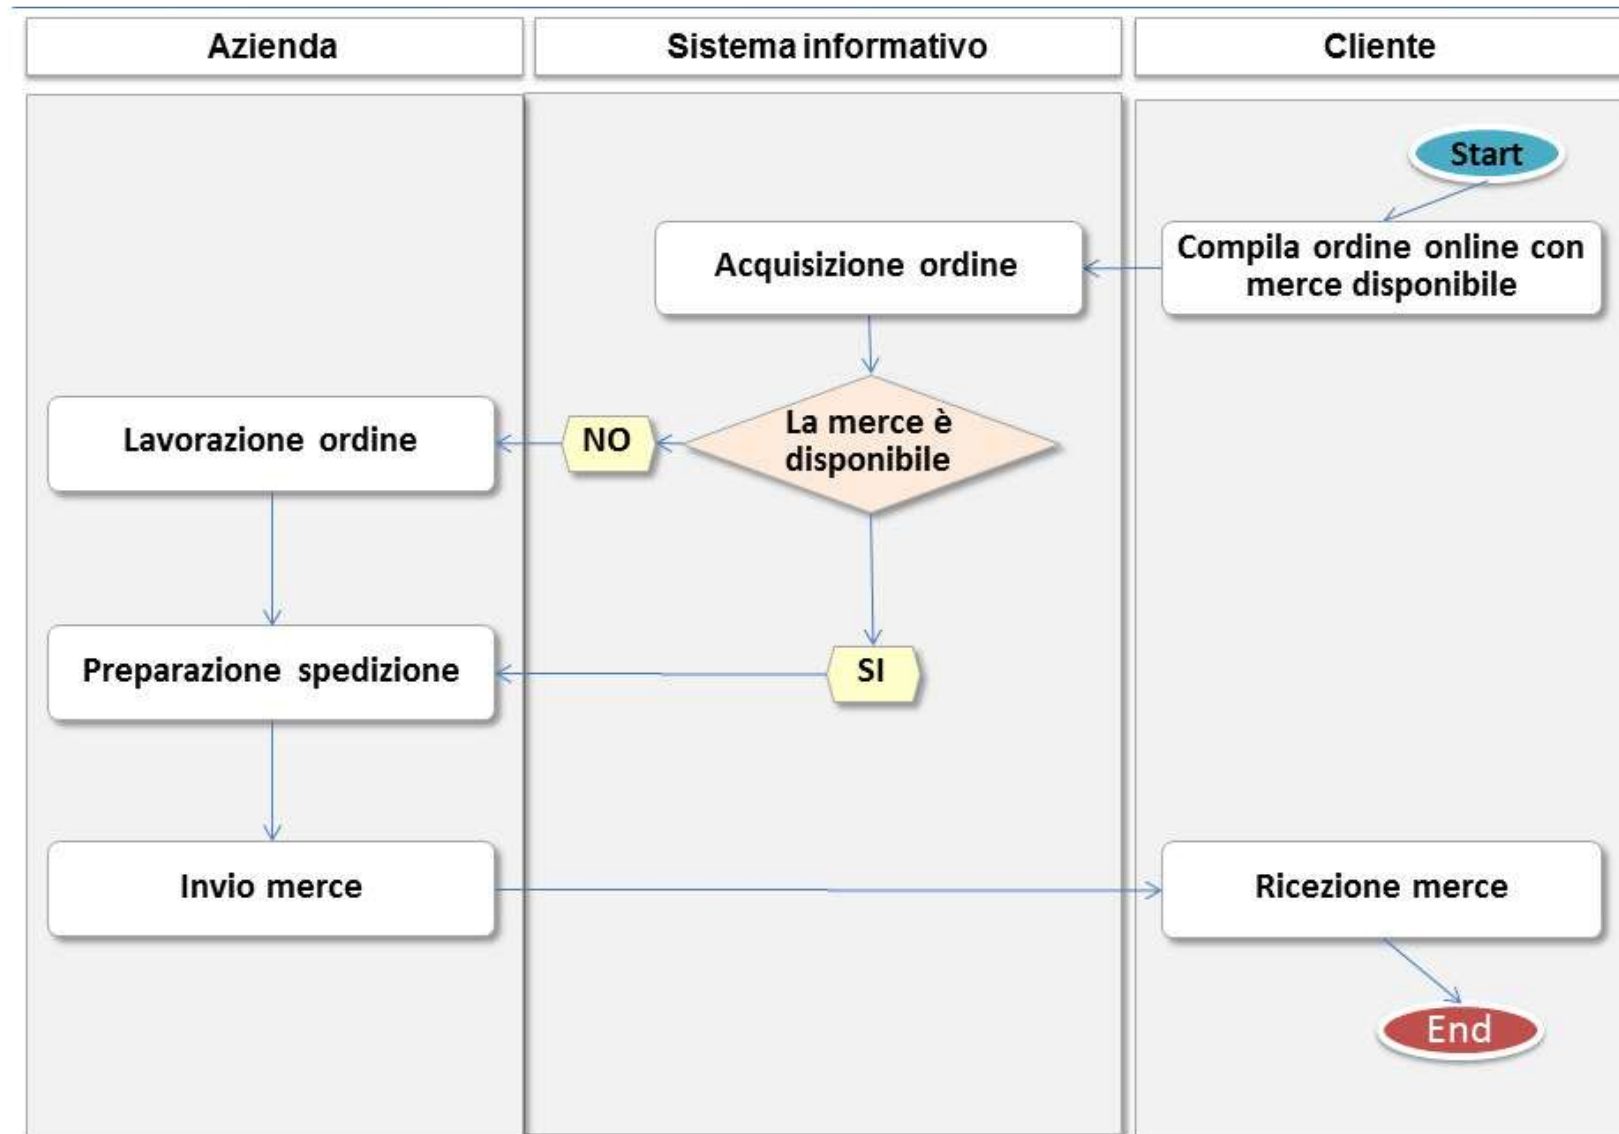

Progetto

- Un **progetto** è un insieme di attività che realizza cambiamenti all'interno delle organizzazioni in risposta alle mutate condizioni del contesto (il mercato, la società civile, gli obiettivi dell'organizzazione, ecc).

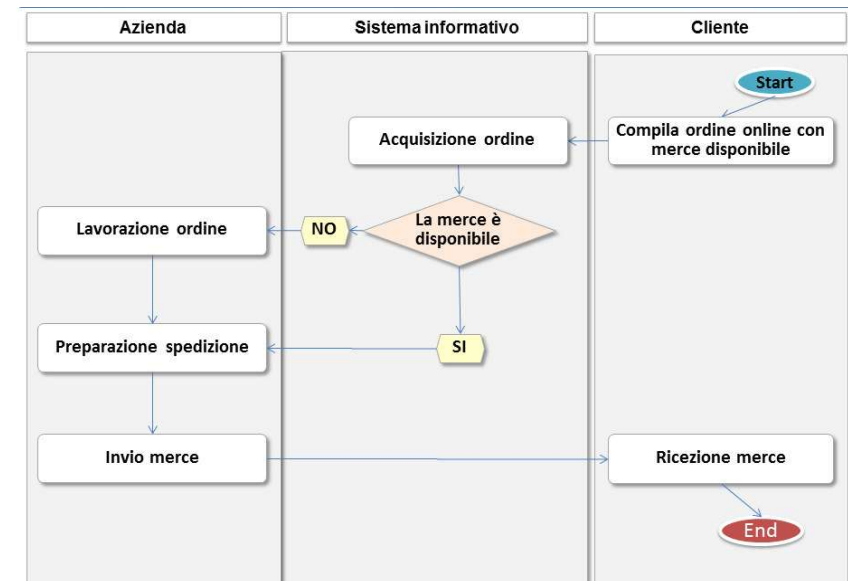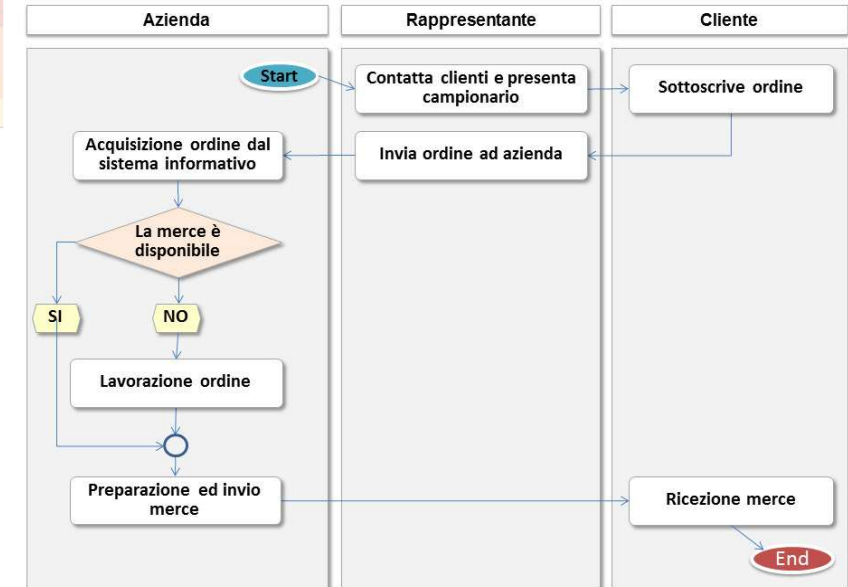



Progetto

- Un progetto **genera dei cambiamenti** in una organizzazione che possono riguardare le infrastrutture, i macchinari, l'organizzazione interna, il personale e ogni altro aspetto.
- Tali cambiamenti generano esigenze di **revisione nei processi** interni dell'organizzazione, indispensabili per adeguare i processi operativi alle nuove situazioni generate dai progetti.



- Errore che un informatico **non** deve compiere:

Non comprendere appieno i processi produttivi che operano in un'azienda.



A che punto siamo

➤ Processo

- I processi sono le attività svolte con continuità all'interno delle organizzazioni, costituite da una sequenza di operazioni note, che vengono eseguite per realizzare gli obiettivi dell'organizzazione.

➤ Progetto

- Un progetto è un insieme di attività che realizza cambiamenti all'interno delle organizzazioni in risposta alle mutate condizioni del contesto (il mercato, la società civile, gli obiettivi dell'organizzazione, ecc).



È importante cambiare?

- **Kodak**, è un'azienda multinazionale statunitense di tipo tecnologico, focalizzata sulla produzione di pellicola cinematografica e apparecchiature per immagini e per la stampa.



È importante cambiare?

- Nel 1975, Steven Sasson, un ingegnere della Kodak, crea il primo prototipo di apparecchio fotografico digitale, ma il consiglio di amministrazione rifiutò quel progetto, perché rendeva inutile la pellicola, che era all'origine della fortuna e del successo dell'azienda.



È importante cambiare?

- Nel 2012 la Kodak dichiarò fallimento, schiacciata dal ritardo accumulato sullo sviluppo della tecnologia digitale.
- Negli ultimi anni si è concentrata nei settori della fotografia digitale, diagnostica medica per immagini, e prodotti per la stampa.



Identificazione di un progetto



- I progetti presentano almeno alcune delle seguenti caratteristiche:
 - implicano un cambiamento complesso all'interno dell'organizzazione;
 - hanno un obiettivo o un punto di arrivo;
 - hanno a che fare con la soluzione di problemi;
 - sono unici
 - hanno limitazioni temporali, economiche, di risorse.
 - presentano una componente di rischio nettamente superiore rispetto ai processi aziendali quotidiani.

Crisi del software degli anni Ottanta



Un noto studio del **Government Accounting Office** degli **USA** del **1979** riportava un'analisi di nove progetti, dalla quale emergeva che:

- ▶ 3,2 milioni di dollari erano stati spesi per sviluppi di applicazioni mai consegnate;
- ▶ 2 milioni di dollari erano stati spesi per sviluppi di applicazioni consegnate, ma mai utilizzate;
- ▶ 1,3 milioni di dollari erano stati spesi per sviluppi abbandonati o rimodificati;
- ▶ 0,2 milioni di dollari erano stati spesi per sviluppi di applicazioni utilizzate, ma solo dopo consistenti modifiche;
- ▶ soltanto 0,1 milioni di dollari erano stati spesi per sviluppi di applicazioni effettivamente utilizzate come erano state consegnate.

Successivamente furono monitorati 13.522 progetti di costruzione software, ottenendo questi “sconsolanti” risultati:

- ▶ 66% di tutti i progetti fallivano (non avevano un risultato utile);
- ▶ 82% dei progetti superavano i tempi previsti;
- ▶ 48% dei progetti producevano sistemi senza le funzioni richieste dai clienti;
- ▶ 55 miliardi di dollari di spreco in un anno, considerando solo i progetti USA.

Leggi catastrofiche

Legge di Murphy

- Se c'è una remota possibilità che qualcosa vada male, sicuramente ciò accadrà e produrrà il massimo danno.
- (Corollario 1) Se c'è una possibilità che varie cose vadano male, quella che causa il male peggiore sarà la prima a verificarsi.
- (Corollario 2) Gli stupidi sono sempre più ingegnosi delle precauzioni che si prendono per impedire loro di nuocere.

Legge di Mealy

- Se un progetto ritarda, aggiungendo una nuova persona al gruppo, questa consuma più risorse di quante ne produce.

Legge dei mille programmatori

- Se assegnate mille programmatori a un progetto senza aver ben definito il disegno del sistema, otterrete un sistema con almeno mille moduli.

Sindrome del 90%

- Il primo 90% di un lavoro viene svolto nel 10% del tempo e il restante 10% nel restante 90%.

Legge di Mayers

- È bene trascurare le fasi di analisi e progetto e precipitarsi all'implementazione allo scopo di guadagnare il tempo necessario per rimediare agli errori commessi per aver trascurato la fase di analisi e di progetto.






Necessità di gestione

- Da quanto visto (complessità, rischio, costi, ecc.) sorge la necessità di introdurre metodologie, tecniche, strumenti di pianificazione e controllo, analisi del rischio e abilità manageriali.

- Il ***project management*** è l'applicazione di conoscenze, strumenti e tecniche alle attività di un progetto al fine di conseguirne gli obiettivi.
- Il ***project management*** è una disciplina manageriale già nota ai tempi degli egiziani e dei romani, per la costruzione di piramidi o altri edifici come il Colosseo, strade, ponti, città, strumenti di guerra ed altro.
- Il ***project management*** si è evoluto per poi svilupparsi nella forma moderna negli anni post 2° guerra mondiale con le missioni spaziali.

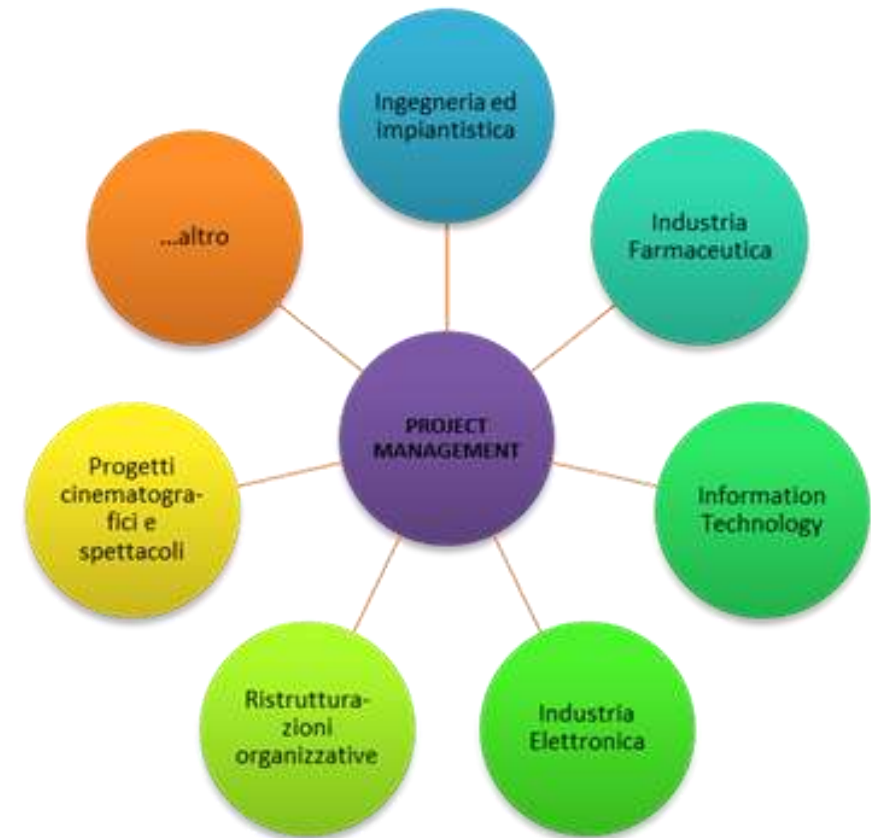

- PMBOK: manuale in continuo aggiornamento che contiene le conoscenze e le prassi standard di project management.

A Guide to the Project
Management Body of Knowledge

PMBOK® GUIDE

Seventh Edition

AND The Standard
for Project Management

ANSI/PMI 99-001-2021

