


Organizzazione dei progetti


Strutture organizzative

- I progetti si possono organizzare secondo tre strutture possibili:

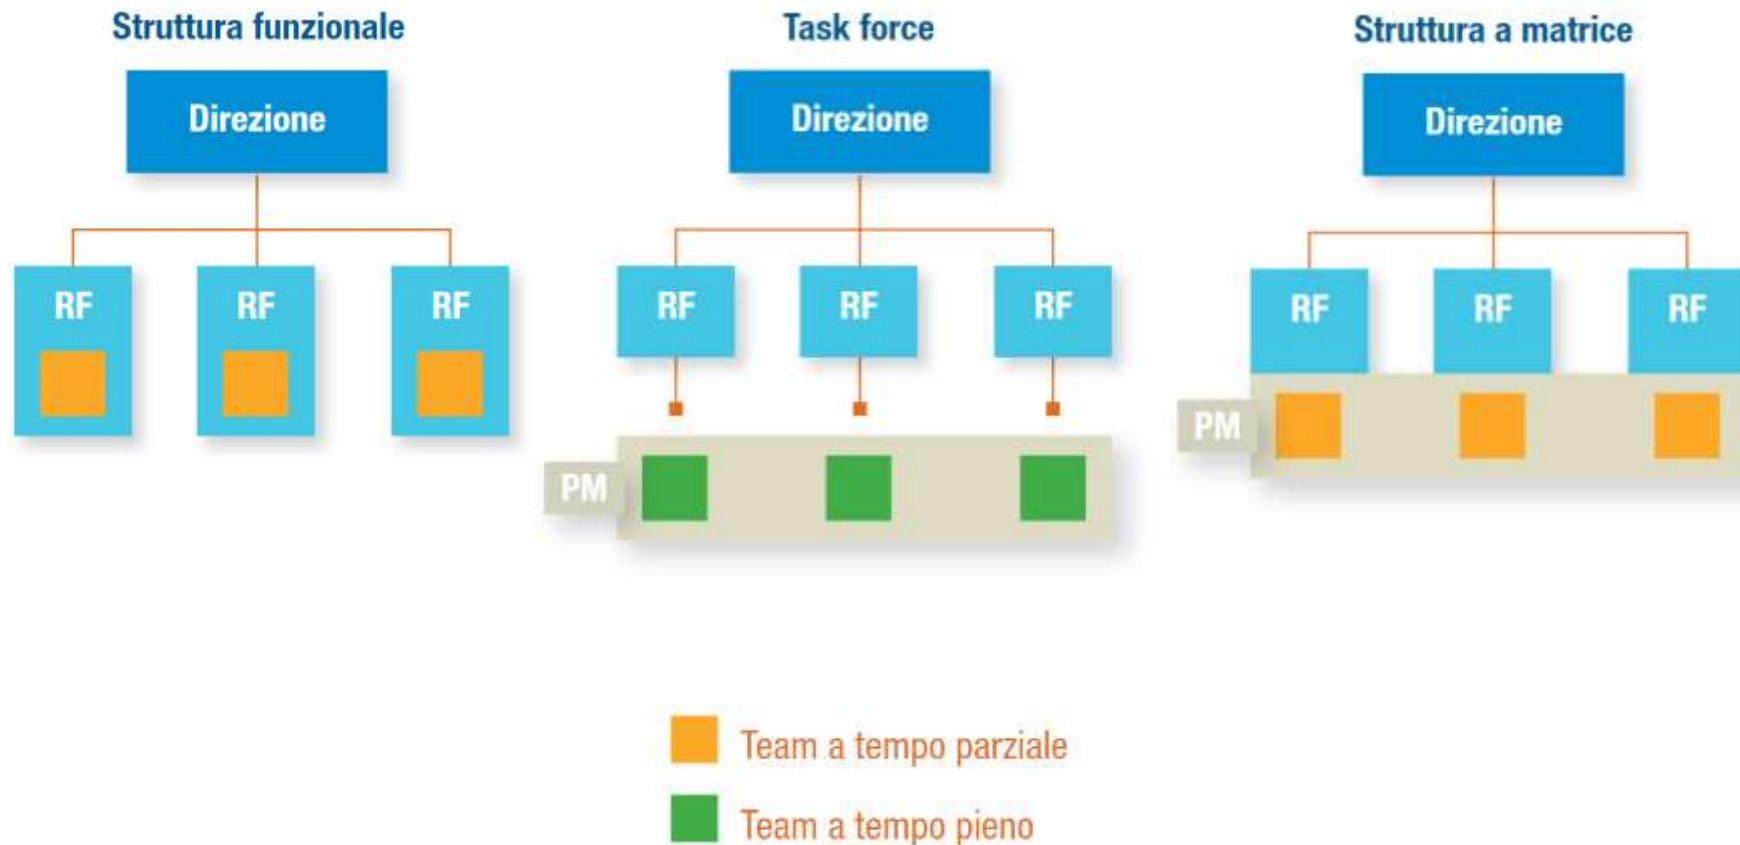


Struttura funzionale

- Il progetto è scomposto in **sottoprogetti**, ciascuno assegnato a una funzione dell'azienda e gestito da un **responsabile funzionale (RF)**
 - I RF si ritrovano all'inizio per concordare il piano di progetto e periodicamente per verificare lo stato di avanzamento
- PRO: semplice da gestire, maggior efficienza
- CONTRO: difficile coordinamento, solo la direzione ha una visione complessiva, minor efficacia

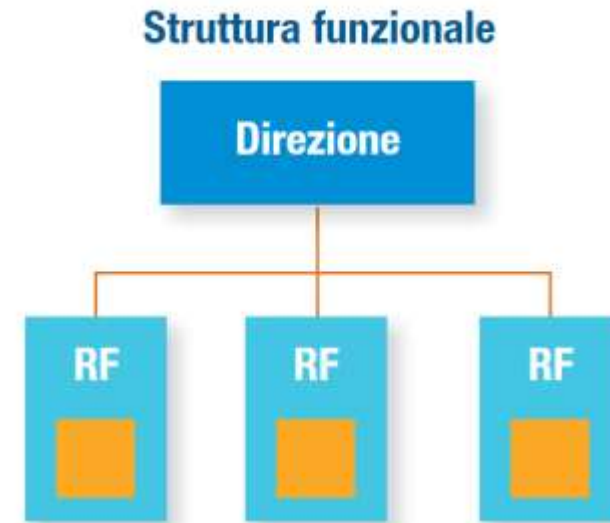


Task force

- Il progetto è gestito da una struttura ad hoc, temporanea, composta da un team di risorse provenienti dalle diverse funzioni dell'azienda.
 - A capo vi è il project manager
 - Le risorse si dedicano al progetto a tempo pieno
- PRO: coesione, maggior coordinamento, orientamento al risultato
- CONTRO: inefficienza nell'utilizzo delle risorse, che vengono distaccate dalle funzioni di origine

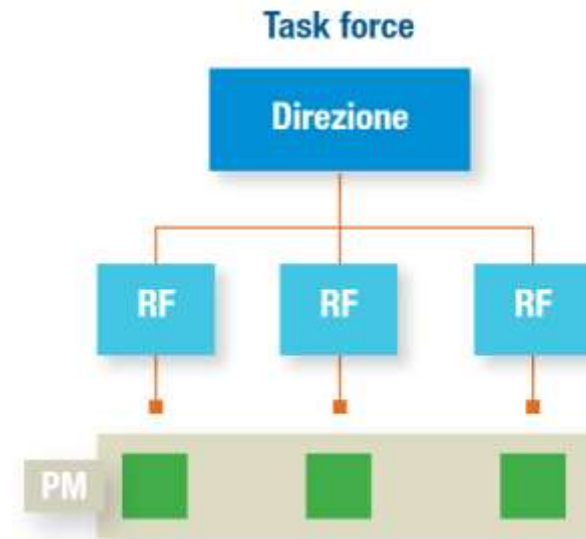

Struttura a matrice

- Trade-off tra task force e struttura funzionale:
 - A capo vi è il project manager
 - Le risorse non si distaccano dalle funzioni di appartenenza: dedicano al progetto solo una parte del loro tempo
- PRO: orientamento al risultato ed efficienza
- CONTRO: struttura complessa da gestire
 - Le risorse dipendono dal project manager e dal responsabile funzionale

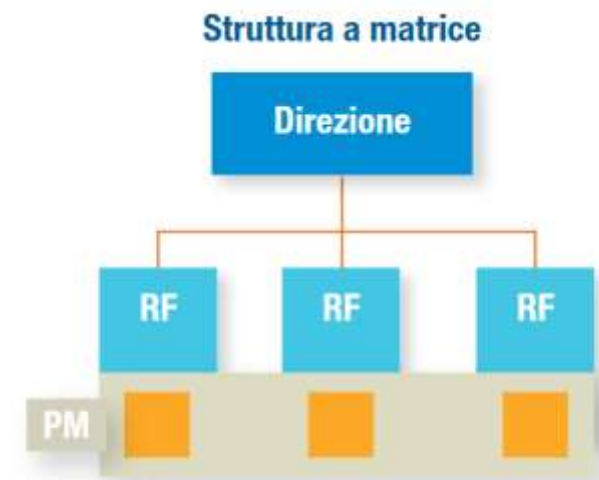

Project manager

- Il project manager, letteralmente il “gestore del progetto”, è colui che individua, impegna e coordina le risorse al fine del conseguimento degli obiettivi di qualità, costi e tempi del progetto.
- Non è necessariamente un dirigente dell'azienda



- capacità di impostare il progetto, pianificando accuratamente le variabili gestionali e controllando attentamente il suo avanzamento;
- intuito e la capacità di essere proattivo
- capacità di coordinamento di risorse numerose ed eterogenee
- tendenza a esercitare la leadership
- adattamento alle situazioni di stress
- abilità nel negoziare, nel decidere e nel risolvere conflitti legati al coinvolgimento di risorse diverse e alla concorrenza fra più progetti

Ruoli del project manager

